

BURKINA-FASO

SECRETARIAT GENERAL DU PREMIER MINISTRE



Autorité de Régulation de la Commande Publique

RAPPORT DEFINITIF SUR L'AUDIT DES MARCHES PUBLICS DE L'EXERCICE BUDGETAIRE 2018

AUTORITE CONTRACTANTE : Mairie de FARA

N° Réf. : 94/18/SM/ARCOP/2020

GROUPEMENT SYNEX - CMC



02 BP 8063 COTONOU BENIN

Tél : 00229 21 30 45 44/ 00229 66 26 67 75

csynex@yahoo.fr / dossyov@yahoo.fr / secretariat@synexconsulting.bj

SOMMAIRE

I.	LETTRE INTRODUCTIVE	5
II.	LETTRE D’OPINION DE L’AUDITEUR.....	7
III.	SYNTHESE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS	10
3.1.	CONSTATS SUR LA MISE EN PLACE ET L’ORGANISATION DE LA PRM PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE	10
3.2.	CONSTATS PRELIMINAIRES SUR L’EXHAUSTIVITE DES MARCHES COMMUNIQUEES ET DES DOCUMENTS ATTENDUS ET SUR L’UTILISATION DE METHODES PEU COMPETITIVES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE	11
3.2.1.	<i>Commentaire sur l’exhaustivité des marchés communiqués par l’autorité contractante</i>	11
3.2.2.	<i>Commentaire sur l’exhaustivité des documents attendus par la mission</i>	11
3.2.3.	<i>Commentaire sur l’utilisation des procédures peu ou non compétitives par l’autorité contractante pendant la période sous revue.....</i>	12
3.3.	CONSTATS SUR LA PASSATION ET L’EXECUTION DES MARCHES SELECTIONNES	14
3.3.1.	<i>Echantillonnage.....</i>	14
3.3.2.	<i>Phase de préparation du marché</i>	14
a-	Contrôles préliminaires d’ordre général	14
b-	Préparation du marché	15
3.3.3.	<i>Phase du déroulement de la procédure de passation</i>	15
a-	Respect des conditions spécifiques liées à l’AOR s’il y a lieu	15
b-	Respect des conditions spécifiques liées à l’ED (Entente Directe) s’il y a lieu.....	15
c-	Respect des conditions spécifiques liées à l’AOOA (Appel d’Offres Ouvert Accéléré) s’il y a lieu	15
d-	Respect des conditions spécifiques liées aux procédures allégées s’il y a lieu.....	15
e-	Dossier d’appel à concurrence	16
f-	Présentation des offres	16
g-	Réception des offres.....	16
h-	Ouverture des offres.....	16
i-	Evaluation des offres et attribution	17
j-	Approbation des travaux de la CAM	17
k-	Signature et approbation du Contrat de marché.....	17
3.3.4.	<i>Phase de l’exécution (réception et de règlement) du marché</i>	17
a-	Réception et règlement du marché.....	17
b-	Respect des conditions spécifiques de recours à l’avenant au marché initial s’il y a lieu	18
3.3.5.	<i>Commentaire sur les délais de passation et d’exécution des marchés sélectionnés au titre de la période sous revue</i>	18
3.4.	CONSTATS SUR LA MATERIALITE PHYSIQUE DES MARCHES SELECTIONNES	18
3.5.	CONSTATS SUR LE TRAITEMENT DES PLAINTES EVENTUELLES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE.....	19
IV.	ANNEXES	20

SIGLES ET ABREVIATIONS

AC : Autorité Contractante

AOOA : Appel d'Offres Ouvert Accélééré

AOO : Appel d'Offres Ouvert

AOR : Appel d'Offres Restreint

ARCOP : Autorité de Régulation de la Commande Publique

CAM : Commission d'Attribution des Marchés

CC : Consultation de Consultant

CCAG : Cahier des Charges Administratives Générales

CCAM : Commission Communale d'Attribution des Marchés

CCAP : Cahier des Clauses Administratives Particulières

CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particulières

DAC : Dossier d'Appel à Concurrence

DAO : Dossier d'Appel d'Offres

DC : Demande de Cotation

DCF : Demande de Cotation Formelle

DCNF : Demande de Cotation Non Formelle

DG-CMEF : Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers

DMP : Direction des Marchés Publics

DPA : Demande de Proposition Allégée

DPro : Demande de Proposition

DPx : Demande de Prix

DR-CMEF : Direction Régionale de Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers

ED : Entente Directe

EDS : Entente Directe Spécifique

ISA : International Standard Audit

MI : Manifestation d'Intérêt

N/A : Non Applicable

ORD : Organe de Règlement des Différends

PI : Prestation Intellectuelle

PPM : Plan de Passation des Marchés Publics

PRM : Personne Responsable des Marchés

TDR : Termes de Référence

TTC : Toutes Taxes Comprises

UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine

LETTRE INTRODUCTIVE

I. LETTRE INTRODUCTIVE

La gestion budgétaire de l'exercice 2018 de la Mairie de FARA a été marquée par la passation de **30 marchés publics** pour un montant global de **FCFA 133 375 503** selon la liste des marchés publics communiquée par l'Autorité contractante.

L'échantillonnage aléatoire simple réalisé selon les TDRs par le Groupement de Cabinets a conduit à la sélection de **3 marchés publics d'une valeur globale de FCFA 22 125 783**, soit un taux de représentativité de **10%** en termes de volume des marchés et **16,58%** en termes de montant des marchés comme le montre le tableau ci-dessous :

Eléments	Communiqués		Sélectionnés		%	%
	Volume	Montant	Volume	Montant		
Total Marchés	30	133 375 503	3	22 125 783	10	16,58

Une fois l'échantillon sélectionné, nous nous sommes rapprochés de la PRM de l'Autorité contractante et avons procédé à la collecte des pièces relatives à ces marchés sélectionnés.

Nous avons ensuite apprécié la mise en place et l'organisation de la PRM au titre de la période sous revue et avons procédé à la revue de conformité des procédures de passation et d'exécution des marchés publics et délégations de service public échantillonnés par rapport aux dispositions réglementaires en vigueur pendant ladite période de même que le contrôle de la matérialité physique de certains marchés choisis au hasard.

A l'issue de nos travaux, nous avons exposé lors d'une séance de restitution une synthèse des constats à l'autorité contractante pour recevoir ses observations éventuelles.

Le présent rapport a pour objet de présenter nos constats et de formuler des recommandations à travers le plan ci-après :

- Lettre d'opinion
- Synthèse des constats et recommandations
- Annexes

Fait à Ouagadougou, le 07 juin 2021



Bamidélé G. Thierry DOSSOU-YOVO
Mandataire du Groupement SYNEX-CMC
Associé Gérant SYNEX Consulting SARL

LETTRE D'OPINION

II. LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR

A

Monsieur le Maire de la Commune de FARA

A

Monsieur le

**Secrétaire Permanent de l'Autorité de Régulation
de la Commande Publique du Burkina-Faso
(ARCOP)**

Conformément au contrat de services n° AAI-ARCOP/03/00/02/05/00/2020/00017, nous avons procédé à l'audit des marchés publics et des délégations de service public de votre autorité contractante au titre de l'exercice budgétaire **2018**.

Notre mission est de formuler à la lumière de nos vérifications un jugement motivé sur les procédures de passation et de contrôle des marchés publics et délégations de service public passés et la qualité des prestations au titre de la période sous revue, par référence aux dispositions de la réglementation nationale des marchés publics, aux directives communautaires, aux documents et standards internationaux.

Nous avons réalisé notre audit conformément aux Normes Internationales d'Audit (ISA) et aux bonnes pratiques observées au plan international en matière d'audit. Ces normes imposent de programmer et d'effectuer l'audit de manière à avoir raisonnablement l'assurance que les marchés publics de l'exercice budgétaire 2018 ont été passés de façon transparente et régulière conformément aux dispositions du code des marchés publics en vigueur.

L'audit indépendant des marchés publics consiste à examiner, par échantillonnage des marchés communiqués par l'autorité contractante, au moyen de tests de conformité vis-à-vis de la réglementation en vigueur des rapprochements et recoupements nécessaires, les éléments probants qui justifient les informations recueillies.

Nous croyons que notre audit constitue une base raisonnable pour l'expression de notre opinion.

Opinion de l'auditeur

A l'issue des contrôles, l'audit a abouti aux conclusions ci-après :

	<u>Commentaires</u>
Sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante	<i>La mission n'a relevé aucune insuffisance relative au contrôle de l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante au regard des documents soumis à notre appréciation notamment l'état d'exécution budgétaire.</i>
Sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission pour chaque marché	<i>Taux d'incomplétude des dossiers communiqués : 56% des pièces demandées (cf. détail au point 3.2.2).</i>

	Commentaires
Sur l'utilisation des méthodes peu ou non compétitives sur la période	L'autorité contractante a utilisé pour 90% de ses marchés communiqués des méthodes peu ou non compétitives (DC, CC, ED, EDS). (cf. détail au point 3.2.3)
Sur régularité de la mise en place et de l'organisation de la PRM (1)	« 6 irrégularités par rapport au code des marchés publics ».
Sur la conformité des procédures de passation et d'exécution des marchés sélectionnés	« 10 cas de non conformités par rapport au code des marchés publics ».
Sur le contrôle de la matérialité physique des marchés sélectionnés	<i>La mission a relevé une (1) anomalie sur 9 possibles (R1-R9), soit un taux de 11% d'irrégularités</i>
Sur le respect des délais	<i>Le contrôle sur les délais a révélé le non-respect de 1 délai. (cf. point 3.3</i>

(1) La mise en place et le fonctionnement de la CAM et de la SCT ont été présentés de façon individuelle dans la revue de conformité de la procédure inhérente à chaque marché.

Fait à Ouagadougou, le 07 juin 2021



Bamidélé G. Thierry DOSSOU-YOVO
Mandataire du Groupement SYNEX-CMC
Associé Gérant SYNEX Consulting SARL

SYNTHESE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS

III. SYNTHÈSE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS

Les principaux constats qui découlent de la revue des marchés sélectionnés seront présentés en quatre (04) points principaux à savoir :

- La mise en place et l'organisation de la PRM pendant la période sous revue ;
- Les procédures de passation et d'exécution des marchés publics ;
- L'exécution des marchés publics (contrôle sur pièces) ;
- La matérialité physique (contrôle in situ).

3.1. CONSTATS SUR LA MISE EN PLACE ET L'ORGANISATION DE LA PRM PENDANT LA PÉRIODE SOUS REVUE

3.1.1. Mise en place de la PRM

R1 à R3

La mission a reçu l'Arrêté n°2016/005/RBMH/PBL/C.FR portant nomination du PRM. Elle est signée par M. Maire de la Commune de FARA et visé par la DP-CEMEF.

3.1.2. Organisation de la PRM

R4 à R10

Observations

- ✓ Par rapport à l'archivage de la documentation relative aux marchés passés (art 9 du décret 2017_0049/PRES/PM/MINEFID et l'arrêté 2017_390/MINEFID/CAB portant procédures d'archivage des documents), la mission a relevé les anomalies ci-après :
 - Les dossiers ne sont pas archivés en un seul lieu. En effet, les DAO se retrouvent chez le PRM, les mandats et autres pièces liées à la dépense sont archivés chez le comptable.
 - Absence d'une liste récapitulative des documents liés à chaque procédure ;
- ✓ Absence d'un système d'archivage électronique.
- ✓ Sur l'existence d'un guide de procédures sur la passation des marchés, l'autorité contractante utilise comme guide, uniquement le code des marchés publics.
- ✓ Sur l'existence d'un système de suivi (la tenue d'un fichier de marchés, des PVs de réunions et les registres pendant la période sous revue), la mission a noté l'inexistence de PVs de réunions et de registre d'enregistrement des plis des soumissionnaires pour la période sous revue ;
- ✓ Défaut d'élaboration et/ou de transmission à la structure chargée du contrôle des états d'exécution mensuels consolidés du PPM (article 2 de l'arrêté 2017_393) ;
- ✓ Non élaboration des statistiques sur les marchés publics au titre de l'exercice sous revue (art. 9 du décret 2017 0049/PRES/PM/MINEFID)

Recommandations

Conformément aux dispositions en vigueur, nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à :

- l'archivage des dossiers de marchés passés conformément aux procédures d'archivage recommandé par les textes en vigueur ;

- la mise en place d'un manuel de procédures sur la passation des marchés ou à défaut, l'utilisation du guide de l'Autorité Contractante de l'ARCOP ;
- la tenue d'un fichier de marchés donnant des renseignements sur chaque marché depuis la passation jusqu'à la réception, l'élaboration des PVs de réunions des organes, la tenue de registres côtés et paraphés ;
- l'élaboration et la transmission à la structure chargée du contrôle des états d'exécution mensuels consolidés du PPM de la structure ;
- l'élaboration des statistiques sur les marchés passés et exécutés.

3.2.CONSTATS PRELIMINAIRES SUR L'EXHAUSTIVITE DES MARCHES COMMUNIQUEES ET DES DOCUMENTS ATTENDUS ET SUR L'UTILISATION DE METHODES PEU COMPETITIVES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE

3.2.1. Commentaire sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante

Le démarrage des travaux sur le terrain a été marqué par la transmission par l'AC de la liste des marchés passés au titre de la gestion budgétaire sous revue. Par ailleurs, au regard des documents soumis à notre appréciation notamment l'état d'exécution budgétaire, la mission n'a relevé aucune insuffisance relative au contrôle de l'exhaustivité des marchés communiqués par l'AC sur la période sous revue.

3.2.2. Commentaire sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission

Observations

Le démarrage des travaux auprès de l'Autorité contractante a été marqué par la collecte de divers documents relatifs à la procédure de passation et d'exécution des marchés publics sélectionnés à la suite d'une liste de pièces communiquée.

Cette collecte se traduit par un **taux d'incomplétude de 56%** dont les résultats détaillés sont présentés en annexe 2. Ce taux s'explique par l'inexistence ou l'indisponibilité des documents ci-après :

Pièces d'ordre général

- Preuve de publication du plan global de passation dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle à priori.

Pièces d'ordre spécifique à chaque marché

- Avis de conformité et/ou de rejet de la DG-CMEF ou du PTF sur le DAC (*Cf. marché 3*)
- Avis de convocation des membres de la CAM (*Cf. marché 3*)
- Courriers déchargés des convocations avec les membres et observateurs (*Cf. marché 3*)
- Déclaration d'impartialité signée par les membres des commissions (CAM & SCT) (*Cf. marché 3*)
- Registre d'enregistrement des plis ou liste d'émargement des déposants des plis pour tous les marchés
- Acte de désignation des membres de la SCT (*Cf. marché 3*)
- Rapport d'évaluation des offres de la sous-commission technique ou rapport d'analyse de la CAM pour la DC, la DPx et la DPA (*Cf. marché 1 & 3*)

- Avis des observateurs sur les travaux d'ouverture et de délibération de la CAM transmis à l'autorité chargée de l'approbation des travaux (*Cf. marché 3*)
- Lettres de transmission ou bordereaux d'envoi des résultats des travaux de la Commission d'attribution des marchés (CAM) à la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF) ou aux PTF (*Cf. marché 3*)
- Avis de conformité et/ou de rejet de la DG-CMEF ou des PTFs sur les résultats des travaux de la CAM (*Cf. marché 3*)
- Courrier de notification/Bordereau d'envoi du contrat au titulaire pour enregistrement pour tous les marchés
- Ordre de commandes pour les marchés à commandes et de clientèle (*Cf. marché 2*)
- Lettres de demande de réception adressées par le titulaire à l'AC (*Cf. marché 1 & 2*)
- PV de réception (pré-réception technique, provisoire et définitive) (*Cf. marché 2 & 3*)
- Réponse à la demande de réception définitive à l'entrepreneur pour tous les marchés
- Attestations de service fait ou bordereaux de livraison (*Cf. marché 1 & 2*)
- Avis de crédits, les états contradictoires pour tous les marchés
- Etat de liquidation des pénalités de retard pour tous les marchés
- Caution de l'avance de démarrage (*Cf. marché 3*)
- Preuve de remboursement de la caution de bonne exécution si réception définitive (*Cf. marché 3*)
- Décharges des Lettres d'invitation à soumissionner pour les consultations restreintes (appel d'offres restreint, demandes de cotations et consultation de consultants) (*Cf. marché 1*)
- Lettre de notification d'attribution pour les procédures de demandes de cotations et de consultation de consultants (*Cf. marché 1*)
- Dossier d'exécution validé par le service compétent (Service technique, Maître d'Ouvrage) (*Cf. marché 3*)
- Plans de recollement (*Cf. marché 3*)
- PV de réunion de chantier (*Cf. marché 3*)
- Rapport de supervision et de contrôle du service technique ou du bureau de contrôle (*Cf. marché 3*)
- Comptabilité matière (registre ou fiche de stock des matières montrant les sorties et les entrées de biens) (*Cf. marché 1 & 3*)
- Guide de procédures sur la gestion de la comptabilité matières (*Cf. marché 1 & 3*)

Recommandations

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à l'archivage correct des dossiers de marchés et de mettre en place les documents essentiels liés à la passation et à l'exécution des marchés.

3.2.3. Commentaire sur l'utilisation des procédures peu ou non compétitives par l'autorité contractante pendant la période sous revue


La répartition des marchés publics passés par procédure par l'autorité contractante se présente comme suit :

Tableau : Récapitulatif des marchés passés par procédure

Procédures	Nombre	%
DCF	12	40%
DCNF	14	47%
AO	1	3%
EDs	1	3%
DPX	2	7%
Total	30	100%

Source : Nos travaux.

De façon graphique, cette répartition par procédure se présente comme suit :

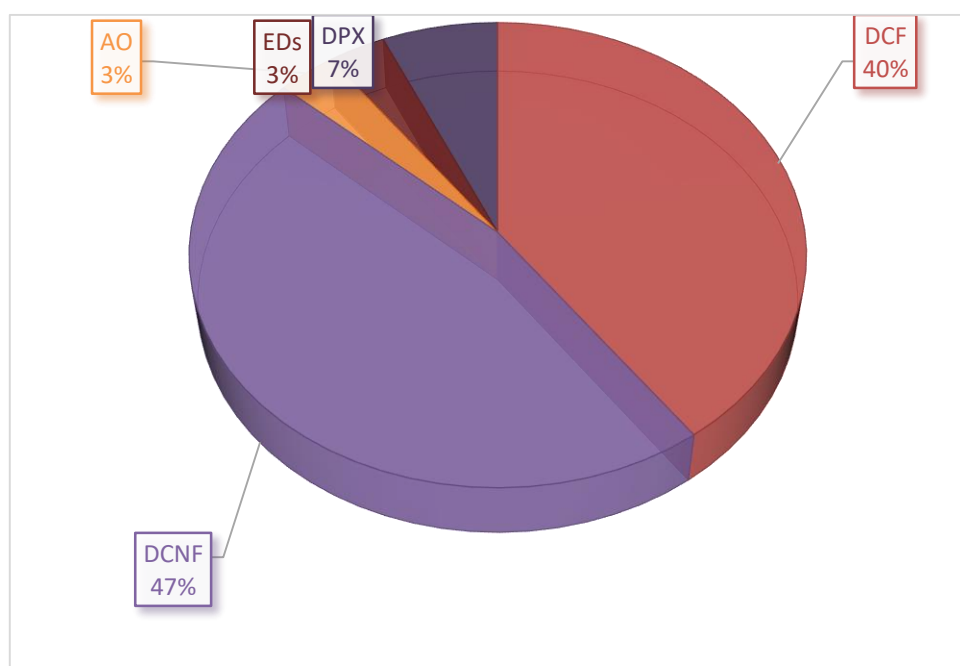

On note qu'au cours de l'exercice 2018, l'autorité contractante a utilisé la demande de cotation formelle et non formelle (DC) pour passer 84% de ses marchés publics. Rappelons que la procédure d'appel d'offres ouvert qui est la règle, n'a été utilisée à 3% au titre de la période sous revue.

3.3. CONSTATS SUR LA PASSATION ET L'EXECUTION DES MARCHES SELECTIONNES

3.3.1. Echantillonnage

Sur la base des TDRs de la mission, les résultats de l'échantillonnage des marchés à auditer pour le compte de la gestion budgétaire sous revue se présentent comme suit :

Procédures	Nombre de marchés	Montant des marchés
DPX	1	20210783
DCF	1	1200000
ED	1	715000
Total sélectionné	3	22 125 783
Total communiqué	30	133 375 503
%	10	16,58

Nos contrôles sur la passation et l'exécution des marchés portent donc sur **trois (3) marchés** d'une valeur globale de **FCFA 22 125 783**.

Le détail des marchés communiqués et sélectionnés est présenté en annexe 1.

Les anomalies observées aux différentes phases de préparation, de déroulement de la passation à l'attribution et de l'exécution physique des marchés sélectionnés sont résumées dans les paragraphes suivants.

3.3.2. Phase de préparation du marché

a- Contrôles préliminaires d'ordre général

RI à R8

Observations

La mission a relevé :

- Besoins non formellement exprimés par les services bénéficiaires lors de l'élaboration du PPM (article 5 de l'arrêté 2017_393). En effet, la mission pas reçu les fiches d'expression de besoins relatives aux travaux d'élaboration du PPM.
- Non publication du plan global de passation des marchés dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle à priori (art 50 du décret 2017_049).

Recommandations

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à l'avenir à :

- Recueillir de façon formelle l'expression des besoins auprès des services et directions lors de l'élaboration du PPM ;
- Publier le plan global de passation des marchés conformément aux dispositions en vigueur.

b- Préparation du marché

R9 à R11

Les diligences effectuées sur les documents d'ordre général et relatives à la programmation des marchés exécutés notamment le PPM et les dossiers de marchés n'ont pas révélé d'anomalie.

3.3.3. Phase du déroulement de la procédure de passation

a- Respect des conditions spécifiques liées à l'AOR s'il y a lieu

R12 à R16

Non applicable

b- Respect des conditions spécifiques liées à l'ED (Entente Directe) s'il y a lieu

R17 à R21

Non applicable

c- Respect des conditions spécifiques liées à l'AOOA (Appel d'Offres Ouvert Accéléré) s'il y a lieu

R22 à R23

Non applicable

d- Respect des conditions spécifiques liées aux procédures allégées s'il y a lieu

R24 à R33

Observations d'ordre spécifique

La mission a relevé :

- Conditions irrégulières de déroulement de la procédure (Art 72 du décret 2017_049). En effet, le service bénéficiaire n'a pas été associé à l'ouverture des plis de la demande de cotation (Cf. *marché1*).
- Mode d'identification des fournisseurs non préalablement établi (art 72 du décret 2017_049). L'AC ne dispose pas d'un fichier fournisseur qu'elle consulte au préalable (Cf. *marché 1*).

Recommandations

La mission recommande à l'autorité contractante de veiller à:

- Ce que la composition du comité restreint soit respecter en associant le service bénéficiaire à l'ouverture des plis des marchés de demande de cotation.
- ce que les trois (03) fournisseurs sollicités pour les consultations restreintes soient choisis dans un répertoire de fournisseurs agréés et d'instaurer une rotation entre fournisseurs de façon à faire participer tous les candidats potentiels.

e- Dossier d'appel à concurrence

R36 à R46

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation.

f- Présentation des offres

R49 à R53

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation.

g- Réception des offres

R54 à R56

Observation d'ordre général

La mission a relevé la non mention des informations liées à la réception dans un document (registre ou liste des offres réceptionnées) permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de réception des offres (Art 94 du décret 2017_049) pour tous les marchés.

Recommandation

La mission recommande à l'autorité contractante de mentionner les informations liées à toute procédure de passation dans un document (registre ou liste émargée des offres réceptionnées) permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de réception des offres conformément aux dispositions en vigueur.

h- Ouverture des offres

R57 à R70

Observations d'ordre général

La mission a relevé :

- Pièces obligatoires des offres des soumissionnaires non paraphés par tous les membres de la commission (art 98 du décret 2017_0049/PRES/PM/MINEFID) (Cf. marché 3) ;
- Non émargement du PV d'ouverture des offres par tous les membres présents de la CAM (art 98 du décret 2017_0049/PRES/PM/MINEFID) ou autres pour les DC (art 72, 14 du décret 2017_0049) (Cf. marché 3)
- Absence de mention des plis reçus hors délais dans le PV d'ouverture des plis (art 97 du décret 2017_0049/PRES/PM/MINEFID) (Cf. marché 3) ;
- Non mention de la lecture à haute voix et en seul temps des offres techniques et des offres financières en relevant la date et l'heure de dépôt de chaque plis, le nom de chaque soumissionnaire, le montant de chaque offre et le cas échéant le montant de chaque variante, des rabais proposés, (art 98 du décret 2017_0049/PRES/PM/MINEFID) (Cf. marché 3)

Recommandations

Conformément aux dispositions en vigueur, la mission recommande à l'autorité contractante de veiller :

- Au paraphage des pièces obligatoires des offres, des différents soumissionnaires par tous les membres de commission ;
- A l'émargement du PV d'ouverture des offres par tous les membres présents de la CCAM
- A la mention dans le PV d'ouvertures des informations sur les plis reçus hors délai ;
- Au respect des conditions d'ouverture des offres relatives à la lecture à haute voix et en seul temps des offres techniques et des offres financières en relevant la date et l'heure de dépôt de chaque plis, le nom de chaque soumissionnaire, le montant de chaque offre pour les marchés de travaux et de fournitures. Ces conditions doivent être transcrites de façon littérale dans le PV d'ouverture des offres.

i- Evaluation des offres et attribution

R71 à R91

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation.

j- Approbation des travaux de la CAM

R92

La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des PV de délibération des marchés soumis à son appréciation.

k- Signature et approbation du Contrat de marché

R93 à R100

Observations d'ordre général:

La mission a relevé que la majorité des pièces essentielles constitutives dans les contrats telles que le CCAP, le CCAG, le CCTP, ...etc. n'a pas été annexée aux contrats examinés.

Recommandation

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à ce que les pièces essentielles constitutives dans le contrat de marché soient annexées.

3.3.4. Phase de l'exécution (réception et de règlement) du marché

a- Réception et règlement du marché

R101 à R121

La mission n'a relevé aucune insuffisance.

b- Respect des conditions spécifiques de recours à l'avenant au marché initial s'il y a lieu

R122 à R125

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation.

3.3.5. Commentaire sur les délais de passation et d'exécution des marchés sélectionnés au titre de la période sous revue

Observations d'ordre spécifique

La mission a relevé le non-respect des délais au niveau des différentes étapes de passation et d'exécution des marchés audités. Il s'agit :

- Délai entre la signature du projet de contrat par le titulaire du marché et la notification du marché approuvé et de l'ordre de service par le gestionnaire de crédits; norme 15 jours ; effective 23 jours (cf. marché 3).

Par ailleurs, la mission est limitée dans l'appréciation des autres délais du fait de l'absence des pièces (bordereaux de transmission) et/ou de la date certaine de transmission des courriers.

Recommandations

La mission recommande à l'autorité contractante de veiller au respect strict des délais au niveau des différentes étapes de passation et d'exécution des marchés conformément aux dispositions en vigueur. Aussi, recommandons-nous à l'AC de mettre en place un cahier de transmission pour enregistrer les échanges de courriers entre elle et les parties prenantes de la procédure.

3.4. CONSTATS SUR LA MATERIALITE PHYSIQUE DES MARCHES SELECTIONNES

Nos constats sur la matérialité physique des marchés sélectionnés portent sur le marché ci-après sélectionné de façon aléatoire :

Type de marché	Objet du marché	Montant du marché TTC	RP (1)	RD (2)
Travaux	Travaux de construction de douze (12) boutiques de rue au profit de la commune de Fara, Province des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun	20210783	Oui	Non

(1) Réception Provisoire à la date de la revue (oui/non)

(2) Réception Définitive à la date de la revue (oui/non)

Ils se résument comme suit :

Observations

- la réception définitive n'a pas encore été faite malgré l'extension du délai de la garantie.

Recommandation

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à:

- la réception définitive du marché aussitôt après la fin de la période de garantie ;

3.5.CONSTATS SUR LE TRAITEMENT DES PLAINTES EVENTUELLES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE

Aucun marché n'a fait objet de recours auprès de l'ARCOP, selon les informations collectées par la mission.

IV. ANNEXES

- *Liste des marchés communiqués et Echantillon des marchés sélectionnés respectivement pour l'audit de conformité et pour le contrôle de la matérialité physique (annexe 1)*
- *Tableau statistique sur les pièces demandées par la mission et celles communiquées par l'autorité contractante_ Tableau d'incomplétude (annexe 2)*
- *Fiches d'audit et Vues photographiques pour la matérialité physique du marché (annexe 3)*
- *Liste des personnes rencontrées (annexe 4)*

Annexe 1 : Liste des marchés communiqués et sélectionnés

Listes des marchés communiqués

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation du marché	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du titulaire	Montant F CFA	Etat d'exécution du marché
1	BON DE COMMANDE N°CO- FR/01/01/04/00/2018/00/ 00002	27/04/2018	Acquisition de valeur Inactives et de registre au profit de la commune de Fara	DCNF	F	BC	00072868U	ZOBALE Setou	858 800	Entièrement exécuté
2	BON DE COMMANDE N°CO- FR/01/01/04/00/2018/00/ 00003	27/04/2018	Acquisition d'imprimés spécifiques au profit des CSPS de la commune de Fara	DCNF	F	RT	00072868U	ZOBALE Setou	639 000	Entièrement exécuté
3	LETTRE DE COMMANDE N°CO- FR/01/01/04/00/2018/00/ 00004	17/08/2018	Acquisition des consommables pour le fonctionnement des écoles de la commune de Fara	DCF	F	RT	00086078M	YAMEOGO Tebnoma Dénise	2 896 500	Entièrement exécuté
4	BON DE COMMANDE N°CO- FR/01/01/04/00/2018/00/ 00005	17/08/2018	Acquisition de matériel de protection et de petits matériels médicaux-techniques au profit des CSPS de la commune de Fara	DCF	F	RT	00072868U	ZOBALE Setou	1 336 000	Entièrement exécuté
5	BON DE COMMANDE N°CO- FR/01/01/04/00/2018/00/ 00006	17/08/2018	Entretien de matériel, outillage, mobilier et matériels informatiques de la Mairie de Fara	DCF	F	BC	00037853K	ZOUNGRANA	1 200 000	Entièrement exécuté

6	BON DE COMMANDE N°CO- FR/01/01/04/00/2018/00/ 00007	17/08/2018	Acquisition de produits d'entretien ménager pour les services de la Mairie de Fara	DCNF	F	BC	00016004F	BARRY Ibrahima	298 000	Entièrement exécuté
7	BON DE COMMANDE N°CO- FR/01/01/04/00/2018/00/ 00008	17/08/2018	Acquisition de produits d'entretien ménager pour les CSPS de la commune de Fara	DCNF	F	RT	00016004F	BARRY Ibrahima	625 000	Entièrement exécuté
8	BON DE COMMANDE N°CO- FR/01/01/04/00/2018/00/ 00009	31/05/2018	Achat de cartes prépayées pour les services de la Mairie de Fara	DCNF	F	BC	00016004F	BARRY Ibrahima	960 000	Entièrement exécuté
9	LETTRE DE COMMANDE N°CO- FR/01/01/04/00/2018/00/ 00010	16/07/2018	Acquisition de fourniture de bureau au profit de la Mairie de Fara	DCF	F	BC	0003691L	DJIPO Hamadou	2 609 700	Entièrement exécuté
10	BON DE COMMANDE N°CO- FR/01/01/04/00/2018/00/ 00011	02/07/2018	Acquisition de fourniture de bureau au profit des CSPS de la commune de Fara	DCNF	F	RT	0003691L	DJIPO Hamadou	279 500	Entièrement exécuté

11	BON DE COMMANDE N°CO- FR/01/01/04/00/2018/00/ 00012	16/07/2018	Achat d'encre bleu pour l'estampillage de la viande à l'abattoir communal de Fara	DCNF	F	BC	00058503L	OUEDRAOGO Joël Henri	100 000	Entièrement exécuté
12	LETTRE DE COMMANDE N°CO- FR/01/01/04/00/2018/00/ 00014	17/08/2018	Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires publiques de la commune de Fara, Province des Balé, R région de la Boucle du Mouhoun	DPX	F	RT	00038548 A	TEBI Dramane	19 910 730	Entièrement exécuté
13	MARCHEN°CO-FR/01/03/ 02/00/ 2018/00015	28/09/2018	Travaux de construction de douze (12) boutiques de rue au profit de la commune de Fara, Province des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun	DPX	T	BC/FPDCT	00074516F	SANOUClovis Yannick	20 210 783	Entièrement exécuté
14	BON DE COMMANDE N°CO- FR/01/02/07/00/2018/00016	28/09/2018	Suivi-contrôle de construction de douze (12) boutiques de rue au profit de la commune de Fara	DCNF	PI	BC	00088067A	GUINDO Cheick Omar	880 000	Entièrement exécuté

15	LETTRE DE COMMANDE N°CO-FR/01/01/01/00/2018/00/00017	05/10/2018	Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires publiques de la commune de Fara, Province des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun	AOO	F	RT	00038548A	TEBI DRAMANE	51 440 220	Entièrement exécuté
16	BON DE COMMANDE N°CO-FR/01/01/04/00/2018/00/00018	09/11/2018	Pour l'entretien des bâtiments Administratifs des CSPS de la commune de Fara	DCNF	F	RT	00016004F	BARRY Ibrahima	400 000	Entièrement exécuté
17	BON DE COMMANDE N°CO-FR/01/01/09/00/2018 / 00019	09/11/2018	Pour l'achat de gaz pour chaine de froid au profit des CSPS de la Mairie de Fara	ED	F	RT	0003691L	DJIPO Hamadou	715 000	Entièrement exécuté
18	BON DE COMMANDE N°CO-FR/01/01/04/00/2018 / 00020	09/11/2018	Pour l'achat d'autres sources d'énergie au profit des CSPS de la Mairie de Fara	DCNF	F	RT	0003691L	DJIPO Hamadou	375 000	Entièrement exécuté
19	BON DE COMMANDE N°CO-FR/01/01/04/00/2018/00/00021	26/10/2018	Entretien et réparation de véhicules à deux roues au profit de la Mairie de Fara	DCNF	F	BC	00072868U	ZOBALE Setou	496 750	Entièrement exécuté

20	LETTRE DE COMMANDE N°CO-FR/01/01/04/00/2018/00/00022	26/10/2018	Entretien et réparation de véhicules à deux roues au profit des CSPS de la Mairie de Fara	DCF	F	BC	00072868U	ZOBALE Setou	1 129 250	Entièrement exécuté
21	LETTRE DE COMMANDE N°CO-FR/01/03/02/00 /2018/23	09/11/2018	Construction du mur de clôture de l'Inspection Primaire de Fara	DCF	T	BC	00095238K	TIENDREBEOGO MADY	2 001 810	Entièrement exécuté
22	LETTRE DE COMMANDE N°CO-FR/01/01/04/00/ 2018/00024	09/11/2018	Acquisition de trois(03) tricycles au profit de la commune de Fara	DCF	F	BC	0001548N	SINI Ousmane	4 035 000	Entièrement exécuté
23	LETTRE DE COMMANDE N°CO-FR/01/09/04/00/2018/00025	09/11/2018	Réalisation d'un (01) forage positif au CEG de Nabou dans la commune de Fara	DCF	T	BC	00092422N	OUEDRAOGO Sékou	6 950 000	Entièrement exécuté
24	LETTRE DE COMMANDE N°CO-FR/01/01/04/00/2018/00026	09/11/2018	Matériel et outillage scolaire (équipement de trois (03) salles classe) à Bouzourou dans la commune de Fara	DCF	F	BC	00014446H	ZERBO Siaka	2 765 000	Entièrement exécuté
25	BON DE COMMANDE N°CO/	09/11/2018	Suivi-contrôle de construction du mur de la clôture de l'Inspection Primaire de Fara	DCNF	PI	BC	00088067A	GUINDO CHEICK OMAR	130 000	Entièrement exécuté

	FR/01/02/07/00/2018/00027									
26	BON DE COMMANDE N°CO- FR/01/02/07/00/2018/00028	09/11/2018	Suivi-contrôle de réalisation d'un (01) forage positif au CEG de Nabou dans la commune de Fara	DCNF	PI		00059871H	OUEDRAOGO Guy Serges	350 000	Entièrement exécuté
27	BON DE COMMANDE N°CO- FR/01/01/04/00/2018/00030	09/11/2018	Acquisition d'une motocyclette homme (Yamaha CFAO) au profit de la CEB de Fara	DCF	F	BC	00072868U	ZOUNTO SERVICES	1 345 000	Entièrement exécuté
28	BON DE COMMANDE N°CO- FR/01/02/07/00/2018/00031	09/11/2018	Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation du CEG Nabou dans la commune de Fara	DCNF	PI	BC	00088067A	GUINDO Cheick Omar	150 000	Entièrement exécuté
29	LETTRE DE COMMANDE N°CO- FR/01/03/04/00/2018/00032	43413	Travaux de réhabilitation du CEG de Nabou dans la commune de Fara	DCF	T	BC	0003691L	ETS DJIPO HAMADOU & FRERES	3528500	Entièrement exécuté
30	LETTRE DE COMMANDE N°CO- FR/01/03/04/00/2018/00032	43413	Achat de fournitures scolaires complémentaires au profit de la CEB de Fara	DCF	F	BC	00040549A	TAPSOBA Théophile	6759960	Entièrement exécuté

Procédures	Marchés communiqués	Marchés sélectionnés	% de sélection
ED	<i>1</i>	<i>1</i>	45%
EDS	<i>0</i>	<i>0</i>	5%
Recours	<i>0</i>	<i>0</i>	25%
Convention	<i>0</i>	<i>0</i>	25%
Autres	29	2	
TOTAL	30	3	10%

Liste des marchés sélectionnés

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation du marché	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du titulaire	Montant F CFA	Etat d'exécution du marché
1	BON DE COMMANDE N°CO-FR/01/01/04/00/2018/00/00006	17/08/2018	Entretien de matériel, outillage, mobilier et matériels informatiques de la Mairie de Fara	DCF	F	BC	00037853K	ZOUNGRANA P. Sévérin	1 200 000	Entièrement exécuté
2	BON DE COMMANDE N°CO-FR/01/01/09/00/2018 / 00019	09/11/2018	Pour l'achat de gaz pour chaine de froid au profit des CSPS de la Mairie de Fara	ED	F	RT	0003691L	DJIPO Hamadou	715000	Entièrement exécuté
3	MARCHE N°CO-FR/01/03/ 02/00/ 2018/00015	28/09/2018	Travaux de construction de douze (12) boutiques de rue au profit de la commune de Fara, Province des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun	DPX	T	BC/FPDCT	00074516F	SANOUClovis Yannick	20210783	Entièrement exécuté

**Annexe 2 : Tableau statistique sur les pièces demandées et communiquées _
Tableau d'incomplétude**

N°	Pièces attendues par marché	Nbre de pièces reçues			Total obtenu (b)	Total attendu (a)	% d'incmpléte (1-b/a)
		D C F	E D	D P X			
	N° dans l'échantillon=====>				1	2	3
Pièces d'ordre général							
1	Budgets approuvés et exécutés conformément à la loi et de toutes les annexes aux états financiers telles que prévues par le SYSCOA				1	1	0%
2	Balances des comptes ainsi que le grand livre définitif des comptes de l'exercice et correspondants aux états financiers approuvés par les organes délibérants, journal d'opération (gestion en régie) s'il y a lieu				0	0	0%
3	Comptes administratifs et de gestion pour les collectivités locales				1	1	0%
4	Agrément du maître d'ouvrage délégué, son manuel de procédures et la lettre de validation du manuel de procédures				0	0	0%
5	Plan de passation des marchés exercé sous revue				1	1	0%
6	Avis général de passation des marchés au titre de la gestion sous revue				0	0	0%
7	Preuve de publication de l'avis général de passation dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle à priori				0	1	100%
8	Rapport de délibération du comité chargé de l'examen du projet de PPM				1	1	0%
9	Acte d'approbation du projet de PPM par l'ordonnateur du budget				1	1	0%
SOUS TOTAL =====>					5	6	17%
Pièces spécifiques à chaque marché							
10	Dossier d'appel à concurrence (DAC) et éventuellement ses additifs ou modificatifs / Cahier de charges pour les ED sans mise en concurrence	N/A	N/A	1	1	1	0%
11	Lettres de transmission ou bordereaux d'envoi du DAC à la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF) s'il y a lieu ou par les PTFs en cas de financement extérieur (N/A pour les procédures allégées)	N/A	N/A	1	1	1	0%
12	Avis de conformité et/ou de rejet de la DG-CMEF ou du PTF sur le DAC (N/A pour les procédures allégées)	N/A	N/A	0	0	1	100%
13	Avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels ;	1	N/A	1	2	2	0%
14	Preuve de publication de l'avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels (N/A pour les procédures allégées)	N/A	N/A	1	1	1	0%
1	Avis de convocation des membres de la CAM (N/A pour la DC)	N/A	N/A	0	0	1	100%

5						
1 6	Courriers déchargés des convocations avec les membres et observateurs	N/ A	N/ A	0	0	1 100 %
1 7	Déclaration d'impartialité signée par les membres des commissions (CAM & SCT) (N/A pour la DC)	N/ A	N/ A	0	0	1 100 %
1 8	Offres ou propositions des soumissionnaires y compris pour les ED	1	1	1	3	3 0%
1 9	Registre d'enregistrement des plis ou liste d'émargement des déposants des plis	0	0	0	0	3 100 %
2 0	PV d'ouverture des offres	N/ A	N/ A	1	1	1 0%
2 1	Acte de désignation des membres de la SCT (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	N/ A	N/ A	0	0	1 100 %
2 2	Rapport d'évaluation des offres de la sous-commission technique ou rapport d'analyse de la CAM pour la DC, la DPx et la DPA	0	N/ A	0	0	2 100 %
2 3	Avis des observateurs sur les travaux d'ouverture et de délibération de la CAM transmis à l'autorité chargée de l'approbation des travaux (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	N/ A	N/ A	0	0	1 100 %
2 4	Procès-verbal de délibération et la fiche de synthèse	1	N/ A	1	2	2 0%
2 5	Preuves d'approbation des travaux de la CAM par l'organe délibérant ou par le Conseil des Ministres si montant du marché supérieur à 3 milliards (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	N/ A	N/ A	N/ A	0	0 0%
2 6	Lettres de transmission ou bordereaux d'envoi des résultats des travaux de la Commission d'attribution des marchés (CAM) à la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF) ou aux PTF s'il y a lieu	N/ A	N/ A	0	0	1 100 %
2 7	Avis de conformité et/ou de rejet de la DG-CMEF ou des PTFs sur les résultats des travaux de la CAM (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	N/ A	N/ A	0	0	1 100 %
2 8	Preuve de la publication des résultats provisoires dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle	N/ A	N/ A	1	1	1 0%
2 9	Courrier de notification à l'attributaire provisoire ou d'invitation à la négociation pour les PI	N/ A	N/ A	N/ A	0	0 0%
3 0	Preuve de publication des résultats provisoires de l'évaluation technique pour les PI	N/ A	N/ A	N/ A	0	0 0%
3 1	Preuve de transmission des offres financières des soumissionnaires non retenus ou Enveloppes non ouvertes des soumissionnaires écartés pour les PI	N/ A	N/ A	N/ A	0	0 0%
3 2	Preuves de l'invitation des soumissionnaires présélectionnés à l'ouverture des offres financières pour les PI	N/ A	N/ A	N/ A	0	0 0%

3 3	Preuve de publication des résultats des offres financières pour les PI dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
3 4	Courriers de demande des motifs de rejets par le soumissionnaire non retenu s'il y a lieu	0	N/A	0	0	2	100%
3 5	Réponse de l'autorité contractante aux courriers de demande des motifs de rejets s'il y a lieu	0	N/A	0	0	2	100%
3 6	Procès-verbal de négociation pour les PI	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
3 7	Avis de la DG-CMEF sur le projet de contrat sauf pour les MOD	N/A	N/A	1	1	1	0%
3 8	Courrier de notification/Bordereau d'envoi du contrat au titulaire pour enregistrement	0	0	0	0	3	100%
3 9	Contrat signé, immatriculé, approuvé et enregistré (et toute explication sur les écarts entre le contrat signé, l'offre retenue et les dispositions du dossier d'appel d'offres)	1	1	1	3	3	0%
4 0	Ordre de service (démarrage, suspension, reprise, etc.)	1	1	1	3	3	0%
4 1	Bon de commandes pour les marchés à commandes et de clientèle	1	0	N/A	1	2	50%
4 2	Eventuels avenants au contrat	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
4 3	Lettres de demande de réception adressées par le titulaire à l'AC	0	0	1	1	3	67%
4 4	PV de réception (pré-réception technique, provisoire et définitive)	1	0	0	1	3	67%
4 5	Preuve de transmission des rapports de pré-réception provisoire/définitive technique au maître d'ouvrage par le Service chargé du contrôle technique pour les marchés de travaux ou d'équipements	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
4 6	Réponse à la demande de réception définitive à l'entrepreneur	0	0	0	0	3	100%
4 7	Attestations de service fait ou bordereaux de livraison	0	0	N/A	0	2	100%
4 8	Rapports (livrables) validés pour les PI ainsi que les rapports de validation	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
4 9	Demandes de paiement (avance, décomptes, attachements ou factures définitives) et les preuves de paiement (remises de chèques, virements)	1	1	1	3	3	0%
5	Reçus de demande de liquidation, les factures définitives ou tout registre d'enregistrement des demandes de paiement	1	1	1	3	3	0%

0							
5 1	Etat de liquidation des pénalités de retard	0	0	0	0	3	100 %
5 2	Caution de l'avance de démarrage	N/A	N/A	0	0	1	100 %
5 3	Caution de bonne exécution	N/A	N/A	1	1	1	0%
5 4	Preuve de remboursement de la caution de bonne exécution si réception définitive	N/A	N/A	0	0	1	100 %
SOUS TOTAL =====>		9	5	15	29	64	55%
Pièces complémentaires relatives aux procédures exceptionnelles (Urgence, allégée)							
5 5	Requête d'avis et l'avis de conformité/de rejet de la D-CMEF (entente directe, appel d'offres restreint ou appel d'offres accéléré)	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
5 6	Lettre de demande d'autorisation pour l'AOR ou l'ED	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
5 7	Autorisation de l'autorité compétente (entente directe, appel d'offres restreint ou appel d'offres accéléré)	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
5 8	Décharges des Lettres d'invitation à soumissionner pour les consultations restreintes (appel d'offres restreint, demandes de cotations et consultation de consultants)	0	N/A	N/A	0	1	100 %
5 9	Lettre de notification d'attribution pour les procédures de demandes de cotations et de consultation de consultants	0	N/A	N/A	0	1	100 %
6 0	Compte rendu du Conseil des ministres ou du Conseil de collectivité, le rapport en Conseil pour l'approbation des travaux des CAM et pour l'entente directe	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
6 1	Demandes d'autorisation pour les avenants et les avis d'autorisations de la DG-CMEF	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
SOUS TOTAL =====>		0	0	0	0	2	100 %
Pièces complémentaires relatives à la matérialité physique des marchés de travaux et de fournitures							
6 2	Rapport d'étude de faisabilité couvrant les aspects techniques, financiers, environnementaux, sociétaux préalables à la réalisation des travaux	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
6 3	Dossier d'exécution validé par le service compétent (Service technique, Maitre d'Ouvrage)	N/A	N/A	0	0	1	100 %
6 4	Plans de recollement	N/A	N/A	0	0	1	100 %
6 5	PV de réunion de chantier	N/A	N/A	0	0	1	100 %
6 6	Rapport de supervision et de contrôle du service technique ou du bureau de contrôle	N/A	N/A	0	0	1	100 %

6 7	Comptabilité matière (registre ou fiche de stock des matières montrant les sorties et les entrées de biens)	0	N/ A	0	0	1	100 %
6 8	Guide de procédures sur la gestion de la comptabilité matières	0	N/ A	0	0	1	100 %
	SOUS TOTAL =====>	0	0	0	0	6	100 %
	TOTAL =====>	9	5	15	34	78	56%

Annexe 3 : Fiches d’audit et les Vues photographiques pour la matérialité physique du marché

N°	Contrôles effectués	Risques d’anomalies significatives
R1	<i>Contrôle de l’existence de certaines pièces liées à la matérialité physique</i>	Absence du PV de reception definitive
R2	<i>Réalité physique</i>	Rien à signaler Confère vue photographique
R3	<i>Conformité des prestations vis-à-vis de l’offre</i>	Rien à signaler
R4	<i>4.1. Conformité physique des prestations avec les documents liés à l’exécution</i> <i>4.2. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques</i> <i>4.3. Conformité vis-à-vis des plans et cahier de charges</i> <i>4.4. Conclusion sur la Conformité de la reception, de la livraison ou de l’achèvement s’il y a lieu</i>	Rien à signaler
R5	<i>Cohérence des quantités par grande rubrique et par sondage</i>	Rien à signaler
R6	<i>Existence de malfaçons éventuelles et leur mise à jour/correction</i>	Rien à signaler
R7	<i>Existence de dangers environnementaux et sociaux futurs pouvant découler des travaux</i>	Rien à signaler
R8	<i>Concordance entre le niveau d’exécution physique et les décaissements en cas de non achèvement des travaux à la date de l’audit</i>	Rien à signaler
R9	<i>Existence d’un Avenant au marché initial</i>	Rien à signaler



Annexe 4 : Liste des personnes rencontrées

SYNEX-CMC

LISTE DE PRESENCE DE LA SEANCE DE RESTITUTION

Objet : Mission d'audit des marchés publics au titre des exercices 2018 & 2019

Nom de l'autorité contractante : MAIRIE DE FARA

Date : 12/01/2021

N°	NOMS ET PRENOMS	STRUCTURE	TITRE	CONTACTS ET EMAILS	EMARGEMENT
1	SAGNON Siélé Moumouni	SYNEX	Auditeur comptable	76 66 35 37/71 45 95 13 sagnonmoumouni93@gmail.com	
2	BARRY Yacouba	Mairie	PRM	71 96 70 33/ 75 04 25 25 yacbbarry@gmail.com	
3	ZONOU Adama	Mairie	Comptable	76 55 00 09/70529480 adamouzonou@gmail.com	
4					
5					
